




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 3, 2
1	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	292 días	mié 08/17/22	lun 06/05/23		
2	I ETAPA	44 días	mié 08/17/22	vie 09/30/22		
3	Germinación de semillas de portainjerto y tomate	32 días	mié 08/17/22	dom 09/18/22		
4	Capacitación de injerto de tomate en Estrada Company S.A.	1 día	sáb 09/03/22	dom 09/04/22		
5	Unión de injerto en invernadero con microclima adecuado	12 días	dom 09/18/22	vie 09/30/22	3	
6	Fin I etapa	0 días	vie 09/30/22	vie 09/30/22	5	
7	II ETAPA	5 días	lun 10/03/22	sáb 10/08/22	5FC+3 días	
8	Preparación del área de invernadero	5 días	lun 10/03/22	sáb 10/08/22		
9	Pase de rotovator con moticultor al suelo	1 día	lun 10/03/22	mar 10/04/22		
10	Confección de camas con dimensiones específicas para densidad de siembra y riego	0.5 días	mar 10/04/22	mar 10/04/22	9	
11	Incorporación de gallinaza compuesta y cal	0.5 días	mar 10/04/22	mié 10/05/22	10	
12	Colocación de potes de 5 lb rellenos de tierra original y tierra desinfectada	1 día	mié 10/05/22	jue 10/06/22	11	
13	Colocación de ciento de riego autocompensada de 20 cm entre emisores	0.5 días	jue 10/06/22	jue 10/06/22	12	
14	Aplicación de nematicidas, fungicidas y bactericidas por medio de sistema Venturi	0.5 días	jue 10/06/22	vie 10/07/22	13	
15	Colocación de acolchado gris para cultivo de tomate	1 día	vie 10/07/22	sáb 10/08/22	14	
16	Fin II etapa	0 días	sáb 10/08/22	sáb 10/08/22	15	
17	III ETAPA	180 días	sáb 10/08/22	jue 04/06/23	16	
18	Colocación de plántulas injertadas de tomate	6 mss	sáb 10/08/22	jue 04/06/23		
19	Proceso de manejo agronómico de etapas fenológicas	6 mss	sáb 10/08/22	jue 04/06/23		
20	Evaluación agronómica de parámetros en cada etapa fenológica	6 mss	sáb 10/08/22	jue 04/06/23		

Proyecto: CRONOGRAMA Fecha: mar 08/30/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 3, 2
21	Fin III etapa	0 días	jue 04/06/23	jue 04/06/23	20	
22	IV ETAPA	30 días	jue 04/06/23	sáb 05/06/23	21	
23	Análisis bioestadísticos de resultados obtenidos del cultivo	1 ms	jue 04/06/23	sáb 05/06/23		
24	Análisis económico del cultivo de tomate injertado	1 ms	jue 04/06/23	sáb 05/06/23		
25	Fin IV etapa	0 días	sáb 05/06/23	sáb 05/06/23	24	
26	VI ETAPA	30 días	sáb 05/06/23	lun 06/05/23	25	
27	Presentación y divulgación de resultados (día de campo)	1 ms	sáb 05/06/23	lun 06/05/23		
28	Elaboración de artículo científico en revista indexada SCOPUS	1 ms	sáb 05/06/23	lun 06/05/23		
29	Fin VI etapa	0 días	lun 06/05/23	lun 06/05/23	28	

Proyecto: CRONOGRAMA Fecha: mar 08/30/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

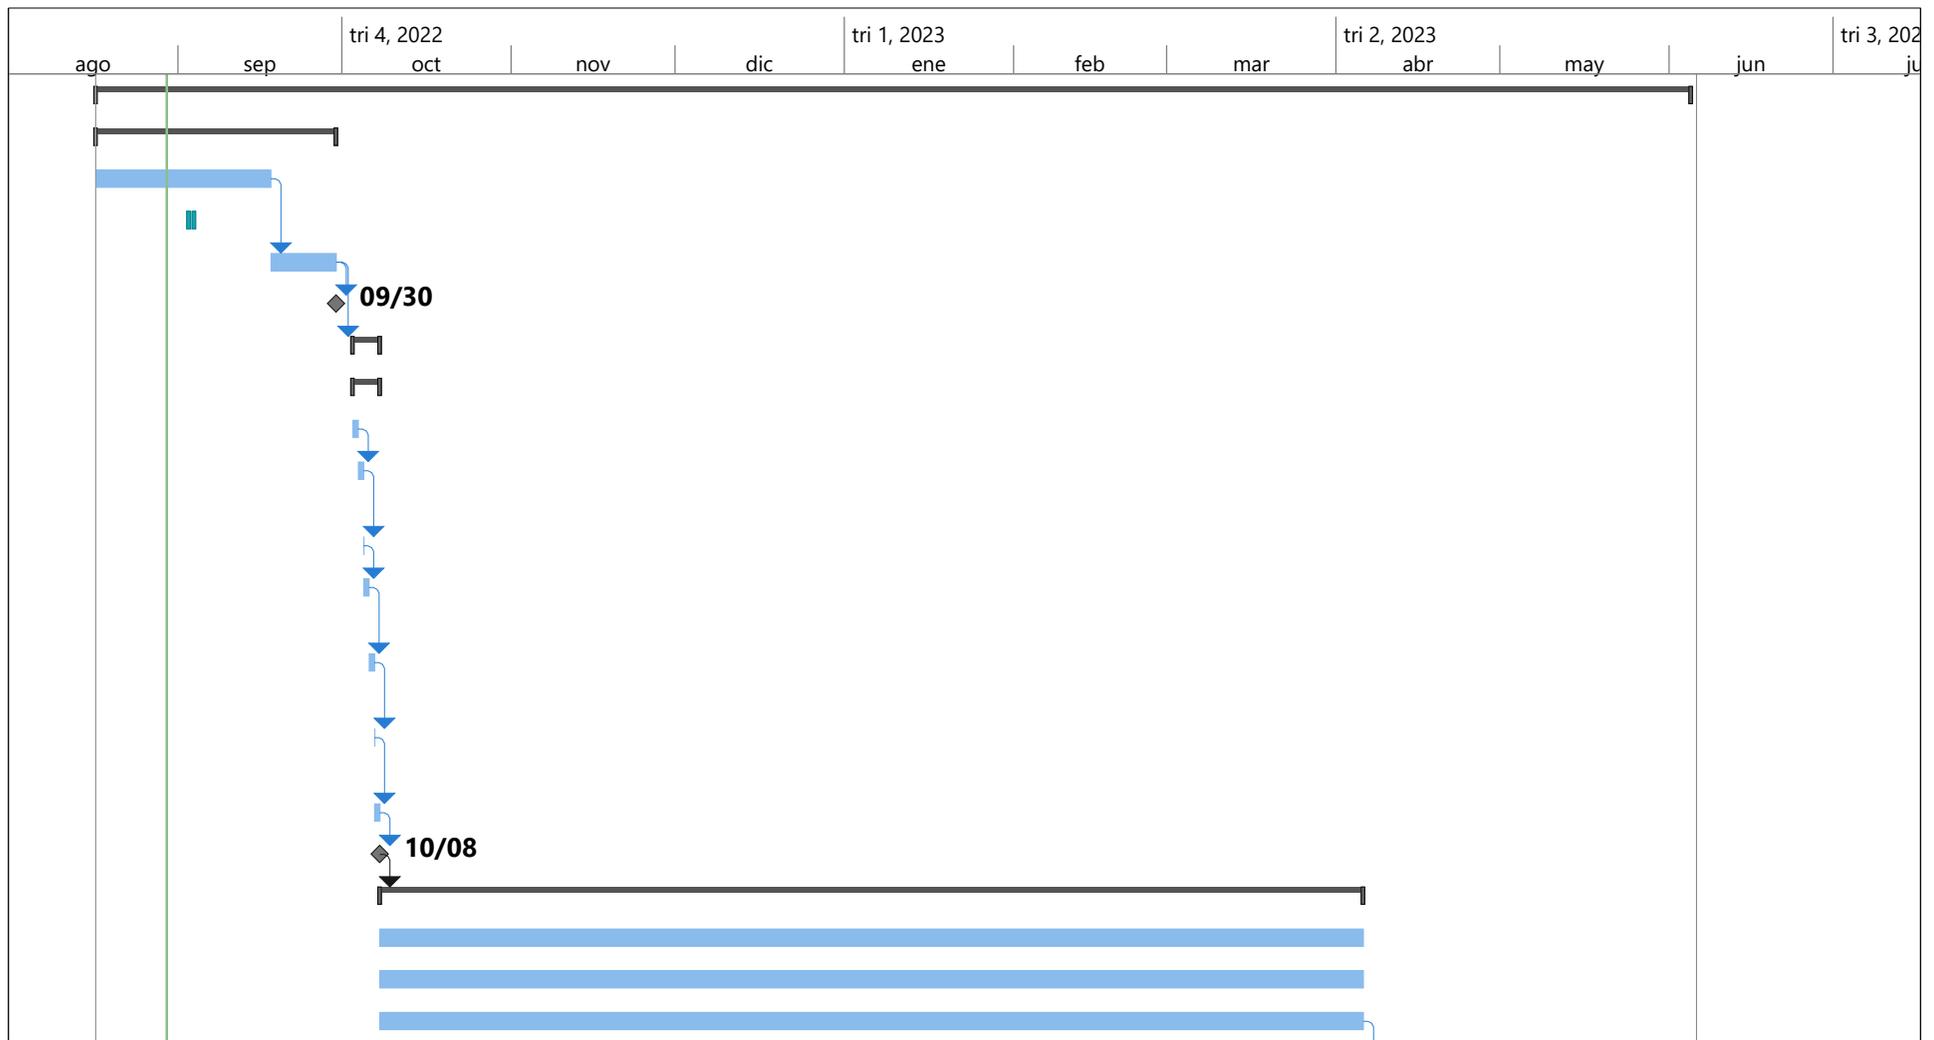

Proyecto: CRONOGRAMA
 Fecha: mar 08/30/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

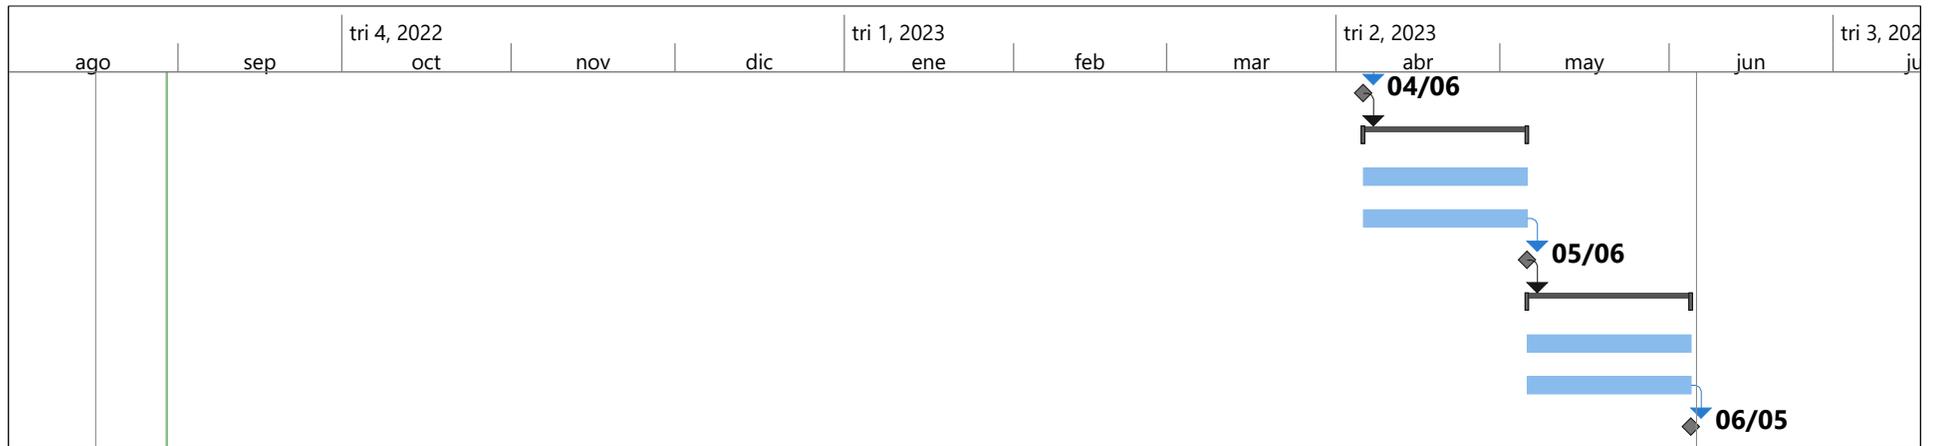

Proyecto: CRONOGRAMA Fecha: mar 08/30/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: CRONOGRAMA Fecha: mar 08/30/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: CRONOGRAMA Fecha: mar 08/30/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
