



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	ago	sep
0			Proyecto: Implementación de Kiosco Informativo Interactivo (KINFO - XR) en la aplicación EON XR	484.75 días	vie 09/30/22	lun 09/02/24			
1			Fase I. Creación de la versión realidad virtual y realidad aumentada para los edificios 1 y 3 de la Universidad Tecnológica de Panamá	353.75 días	vie 09/30/22	jue 02/29/24			
2			Parte I. Adaptación de los modelos 3D de los Edificios 1 y 3	257.75 días	vie 09/30/22	mié 10/11/23			
3	✓		Preparación de los modelos 3D	8 días	vie 09/30/22	mié 10/12/22			
4	✓		Separar los modelos 3D de los edificios 1 y 3	3 días	vie 09/30/22	mié 10/05/22			
5	✓		Exportar los modelos de los edificios 1 y 3 de Blender a un formato compatible con EON	5 días	mié 10/05/22	mié 10/12/22	4		
6	✓		Importar a la aplicación EON los modelos	15 días	mié 10/12/22	lun 11/07/22			
7	✓		Modelo del edificio1	5 días	mié 10/12/22	mié 10/19/22	5		
8	✓		Modelo del edificio3	5 días	mié 10/12/22	mié 10/19/22	5		
9	✓		Evaluar cado uno de los formatos importados a la aplicación EON	10 días	mié 10/19/22	lun 11/07/22	7;8		
10			¡Preparación de los modelos completada!	0 días	lun 11/07/22	lun 11/07/22	9		
11			Personalizar el aspecto de los modelos	150 días	lun 11/07/22	mar 06/13/23			
12			Verificar la distribución de espacios de los modelos de los edificios 1 y 3	10 días	lun 11/07/22	lun 11/21/22			
13			Aplicación de materiales	150 días	lun 11/07/22	mar 06/13/23			
14			Edificio1	150 días	lun 11/07/22	mar 06/13/23	9		
15			Edificio3	150 días	lun 11/07/22	mar 06/13/23	9		
16			Aplicación de imágenes	150 días	lun 11/07/22	mar 06/13/23			
17			Reducir el tamaño del modelo del edificio 1	150 días	lun 11/07/22	mar 06/13/23	9		

Proyecto: Proyecto: Implement
Fecha: jue 06/15/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces		
								ago	sep
18			Reducir el tamaño del modelo del edificio 3	150 días	lun 11/07/22	mar 06/13/23	9		
19			¡Personalización completada!	0 días	mar 06/13/23	mar 06/13/23			
20			Catalogar los espacios fisicos para la aplicación EON	58.67 días	mié 06/14/23	mié 09/06/23			
21			Identificar los espacios para cada uno de los edificios (1 y 3)	10 días	mié 06/14/23	mar 06/27/23	17;18		
22			Agrupar las mallas en blender de los espacios identificados	30 días	mié 06/28/23	mar 08/08/23	21		
23			Exportar los modelos ajustados en el formato .glb	2 días	mié 08/09/23	jue 08/10/23	22		
24			Importar los modelos ajustados a EON-XR	6.67 días	vie 08/11/23	mié 08/23/23	23		
25			Verificar que todas las agrupaciones estén correctas	6.67 días	vie 08/11/23	mié 08/23/23	23		
26			Realizar los ajustes a los modelos, en caso requerido	10 días	mié 08/23/23	mié 09/06/23	24		
27			¡Catalogación completada!	0 días	mié 09/06/23	mié 09/06/23			
28			Generar en blender las animaciones de los recorridos (renderizar las imágenes a utilizar)	20 días	jue 09/07/23	mié 10/04/23			
29			Crear los videos de la animación	20 días	jue 09/07/23	mié 10/04/23			
30			Crear un canal de youtube para el proyecto	5 días	jue 10/05/23	mié 10/11/23			
31			Subir los videos al canal	5 días	jue 10/05/23	mié 10/11/23	29		
32			¡Primera Parte Completada!	0 días	mié 10/11/23	mié 10/11/23			
33			Parte II. Creación de actividades que permitirán la interacción del usuario con los modelos 3D de los edificios 1 y 3 en la aplicación EON	85 días	jue 10/12/23	mié 02/14/24			
34			Planificación de las actividades que contendra cada uno de los espacios identificados	20 días	jue 10/12/23	vie 11/10/23	31		
35			Crear actividades para el Edificio 1	20 días	lun 11/13/23	mar 12/12/23	34		
36			Crear actividades para el Edificio 3	20 días	lun 11/13/23	mar 12/12/23	34		

Proyecto: Proyecto: Implement
Fecha: jue 06/15/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces		
								ago	sep
37			Realizar pruebas de recorrido (mediante PC)	5 días	mié 12/13/23	mar 12/19/23	35;36		
38			Realizar pruebas de recorrido (Realidad Virtual)	5 días	mié 12/20/23	mar 12/26/23	37		
39			Realizar pruebas de Realidad Aumentada	5 días	mié 12/27/23	mié 01/03/24	38		
40			Ajustar las actividades, en caso de que se requiera	10 días	jue 01/04/24	mié 02/14/24	37;38;39		
41			¡Parte II Completada!	0 días	mié 02/14/24	mié 02/14/24			
42			Parte III. Puesta en marcha del proyecto	40 días	vie 01/05/24	jue 02/29/24			
43			Realizar actividades de divulgación	40 días	vie 01/05/24	jue 02/29/24			
44			¡Fase I Completada!	0 días	vie 03/01/24	vie 03/01/24			
45			Fase II. Recorrido 360°	130 días	lun 03/04/24	lun 09/02/24			
46			Parte I. Repositorios de fotografías	125 días	lun 03/04/24	lun 08/26/24			
47			Identificar y crear lista de las locaciones a fotografiar	20 días	lun 03/04/24	vie 03/29/24			
48			Solicitar apoyo a DIGITED	5 días	lun 04/01/24	vie 04/05/24	47		
49			Captura de fotos para mostrar las facilidades de los edificios 1 y 3 (externa e interna)	60 días	lun 04/08/24	vie 06/28/24	48		
50			Crear actividades para el Edificio 1	20 días	lun 07/01/24	vie 07/26/24	49		
51			Crear actividades para el Edificio 3	20 días	lun 07/29/24	lun 08/26/24	50		
52			¡Parte I Completada!	0 días	mié 06/26/24	mié 06/26/24			
53			Parte II. Prueba de recorrido 360°	5 días	mar 08/27/24	lun 09/02/24			
54			Realizar pruebas de recorrido para los edificios (1 y 3)	5 días	mar 08/27/24	lun 09/02/24	50;51		
55			¡Fase II Completada!	0 días	lun 09/02/24	lun 09/02/24			

Proyecto: Proyecto: Implement

Fecha: jue 06/15/23

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual














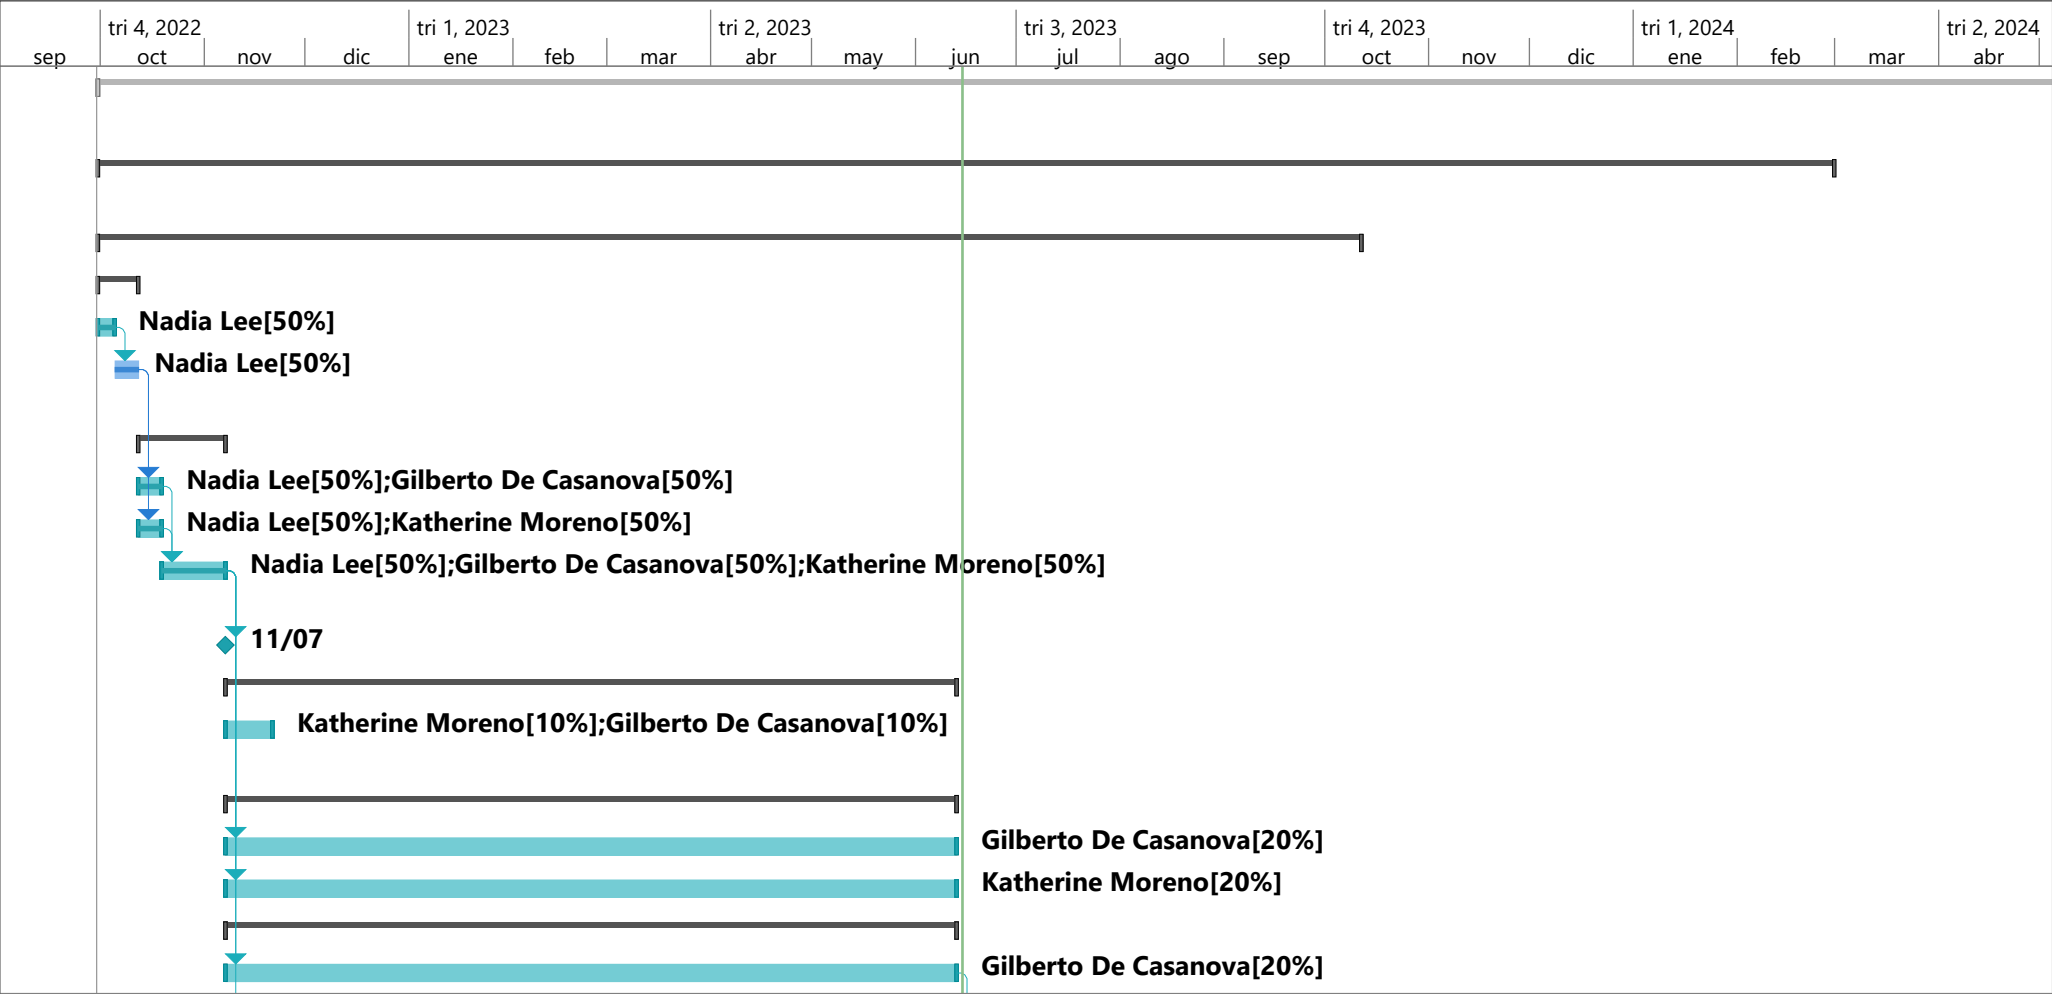

Proyecto: Proyecto: Implement Fecha: jue 06/15/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

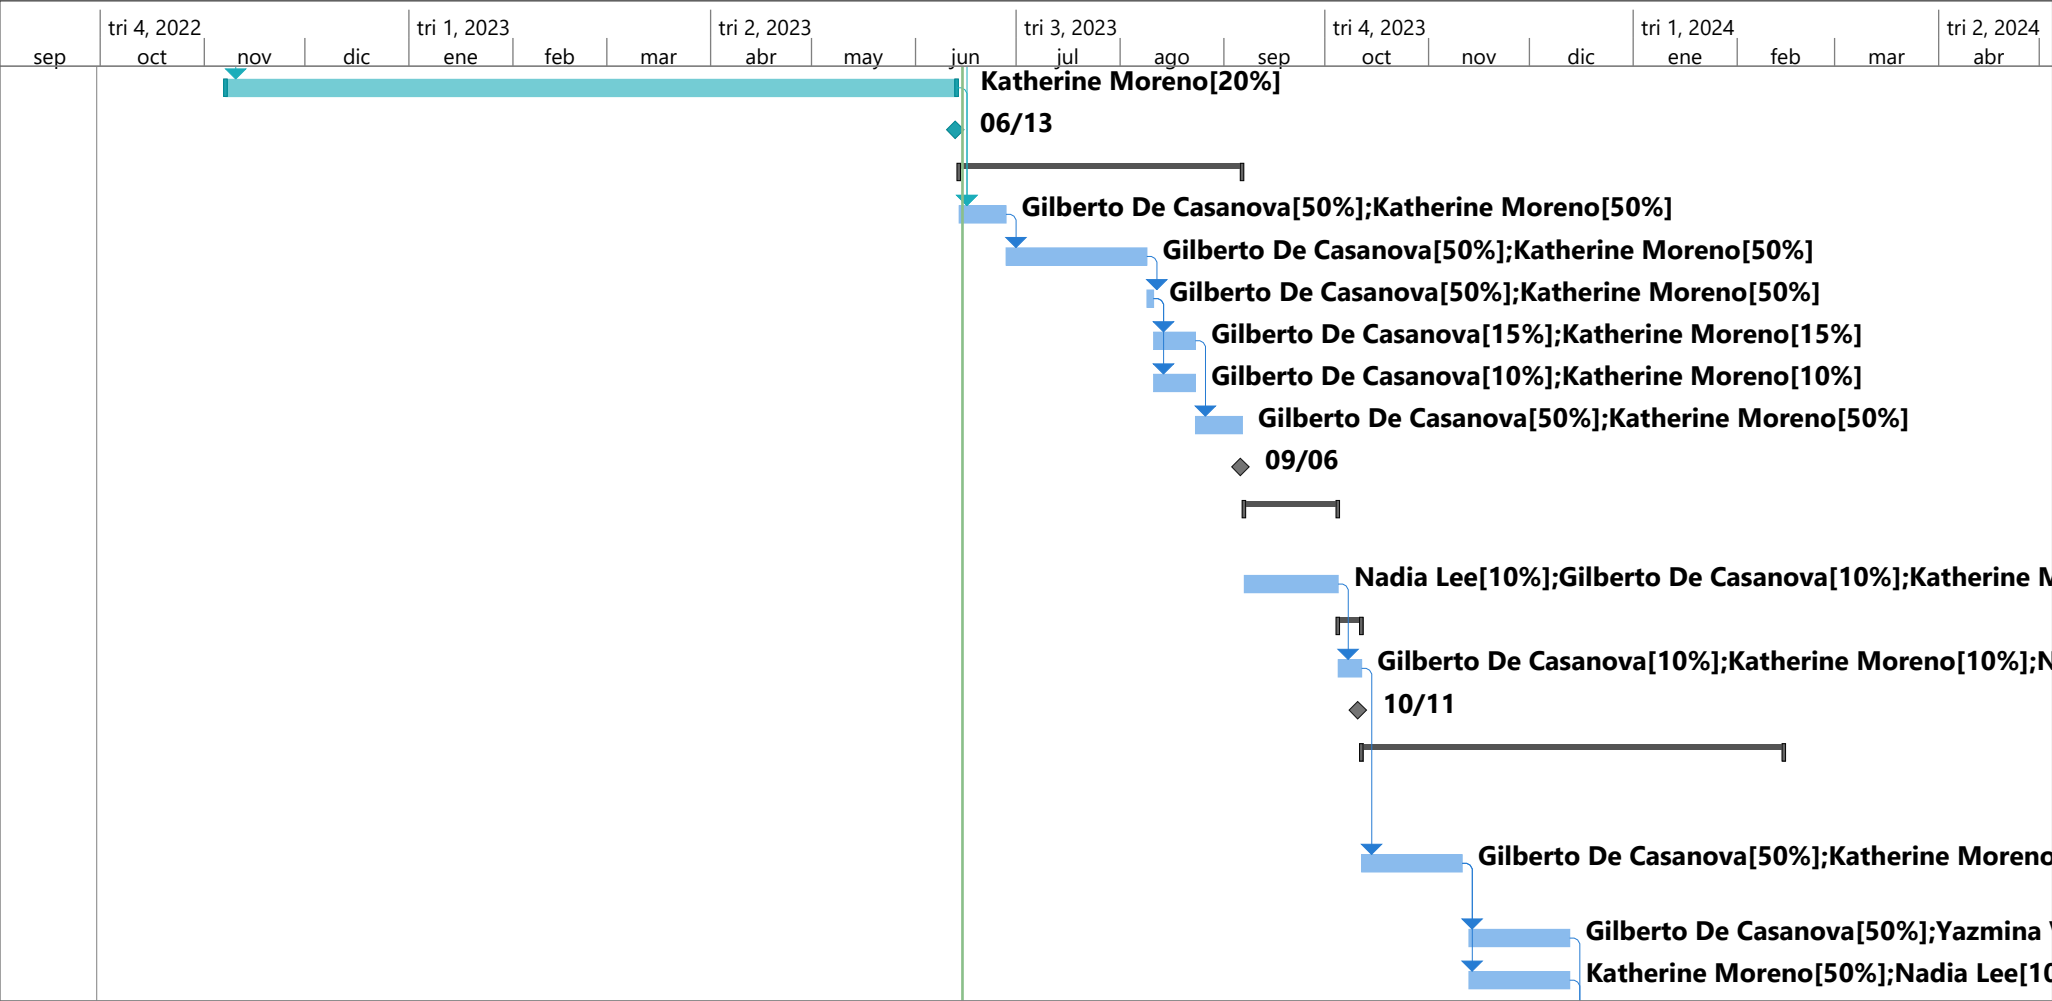

Proyecto: Proyecto: Implement Fecha: jue 06/15/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

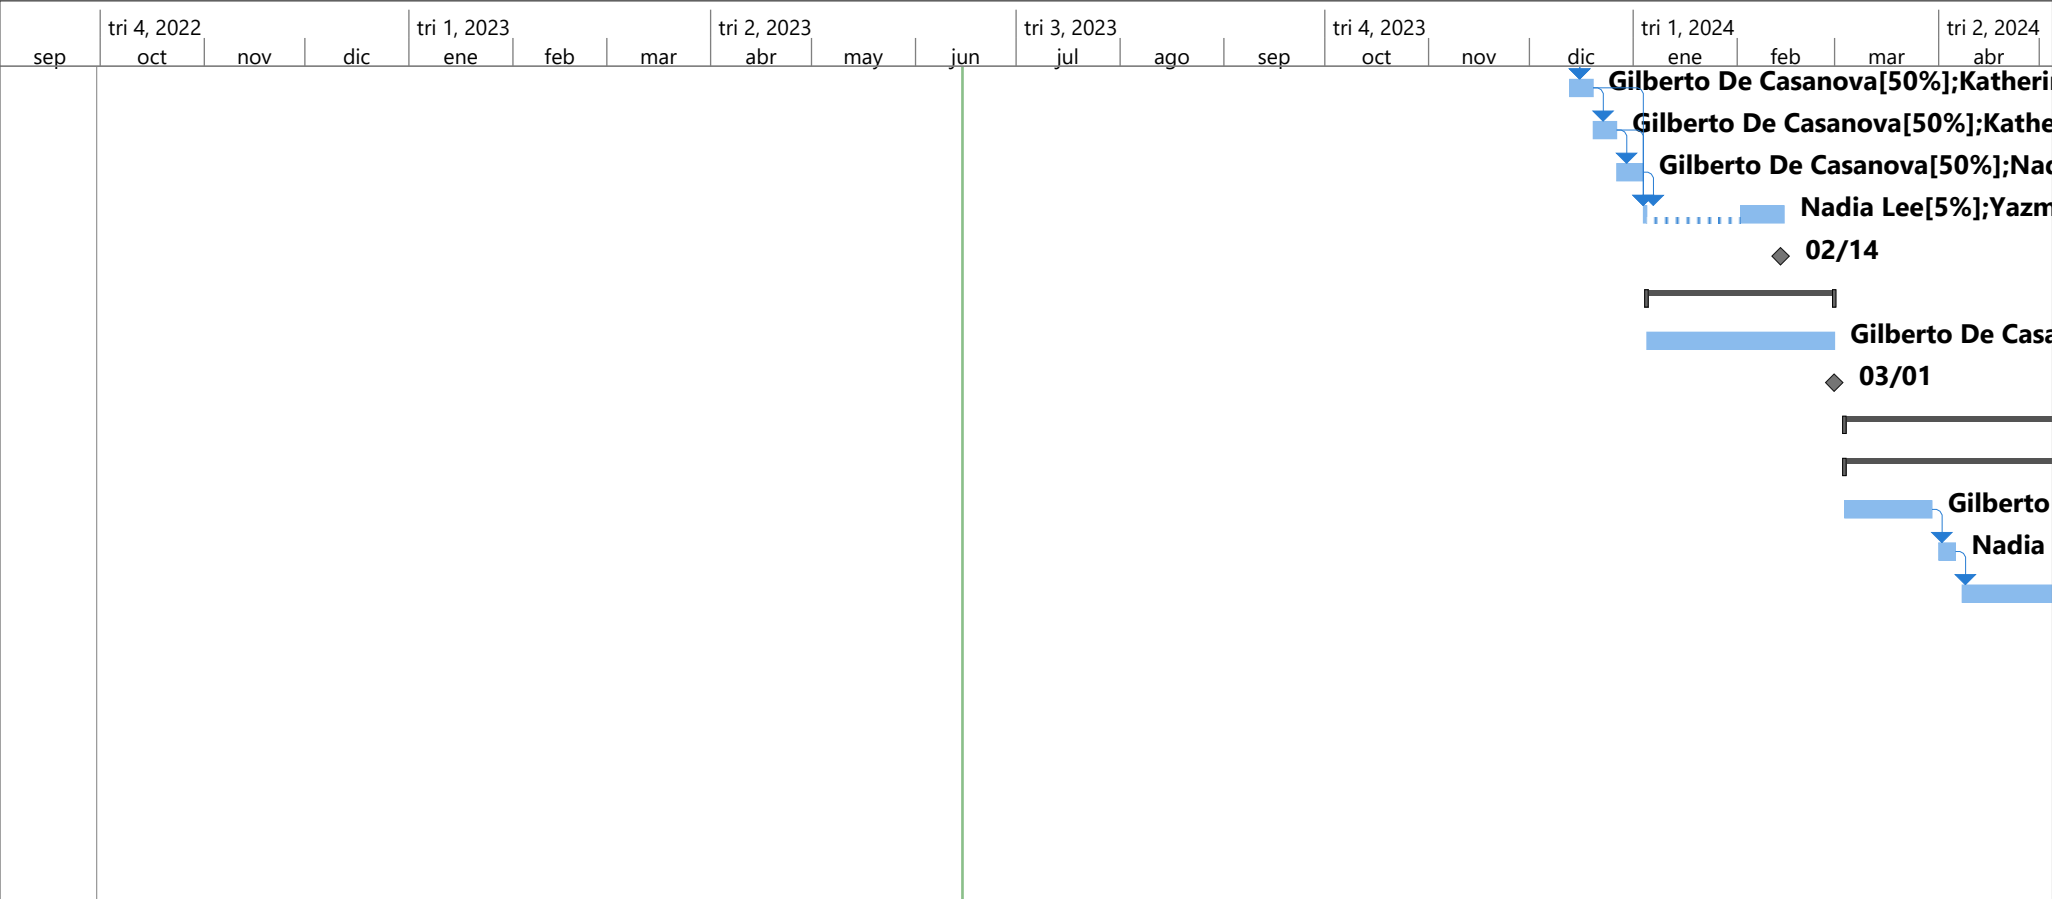

Proyecto: Proyecto: Implement Fecha: jue 06/15/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

may

jun

tri 3, 2024

jul

ago

sep

tri 4, 2024

oct

nov

dic

tri 1, 2025

ene

feb

mar

tri 2, 2025

abr

may

jun

tri 3, 2025

jul

ago

sep

tri 4, 2025

oct

nov

dic

Proyecto: Proyecto: Implement

Fecha: jue 06/15/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 7

