Cronograma de Actividades

Cronograma de actividades.mpp

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		1	**ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS EN ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS**	**146 días**	**jue 15/04/21**	**vie 01/10/21**	
2		1.1	**ETAPA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN**	**146 días**	**jue 15/04/21**	**vie 01/10/21**	
3		1.1.01	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN	6 días	jue 15/04/21	mié 21/04/21	
4		1.1.02	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	140 días	jue 22/04/21	vie 01/10/21	3
5		1.2	**ETAPA DE APLICACIÓN METODOLÓGICA**	**120 días**	**jue 22/04/21**	**mié 08/09/21**	
6		1.2.01	VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA	14 días	jue 22/04/21	vie 07/05/21	3
7		1.2.02	OBSERVACIÓN, APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA	14 días	sáb 08/05/21	lun 24/05/21	6
8		1.2.03	VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL PRE-TEST	14 días	mar 25/05/21	mié 09/06/21	7
9		1.2.04	APLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PRE-TEST	14 días	jue 10/06/21	vie 25/06/21	8
10		1.2.05	SEMINARIO DE REFORZAMIENTO	36 días	sáb 26/06/21	vie 06/08/21	9
11		1.2.06	VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL POST-TEST	14 días	sáb 07/08/21	lun 23/08/21	10
12		1.2.07	APLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL POST-TEST	14 días	mar 24/08/21	mié 08/09/21	11
13		1.3	**ETAPA DE ENTREGA**	**140 días**	**jue 22/04/21**	**vie 01/10/21**	
14		1.3.01	INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	18 días	jue 09/09/21	mié 29/09/21	12
15		1.3.02	REDACCIÓN DE TESIS	138 días	jue 22/04/21	mié 29/09/21	3
16		1.3.03	SUSTENTACÓN DE TESIS	2 días	jue 30/09/21	vie 01/10/21	15,14

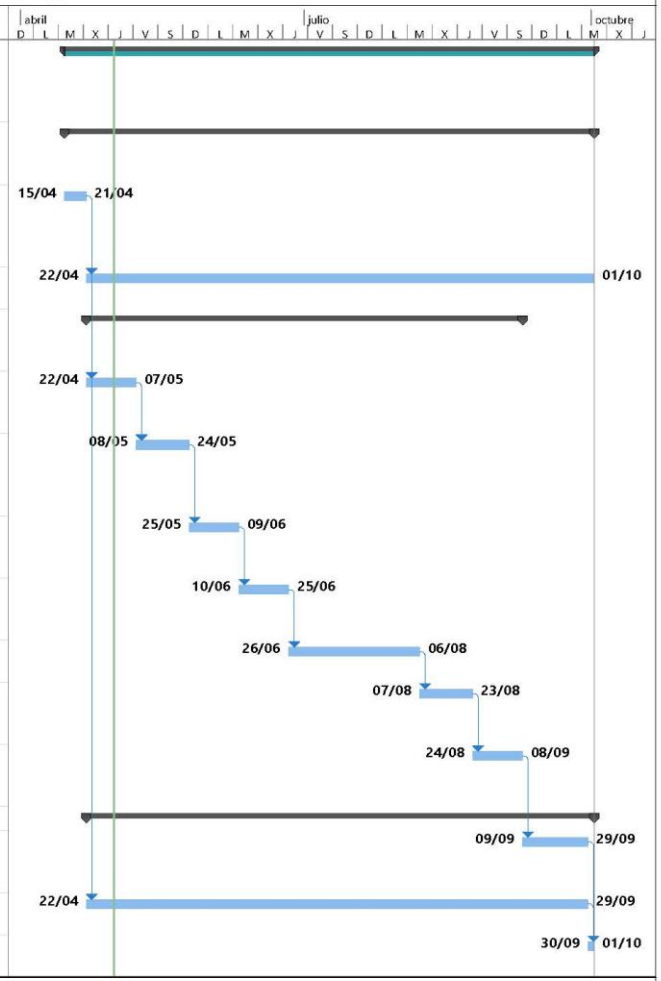

Página 1
